

۱۰۰۸۹۶۳

کارت ضمانت مخصوص شرکت

شماره سریال :

نوع دستگاه :

مشهدهای دستگاه

تاریخ نصب (شروع دوره ضمانت) :

تلفن :

نام و نام خانوادگی نصاب :

اینجانب تهذب می نمایم با رعایت کامل کلیه مطالب مندرج در دفترچه راهنمای محصول و الزامات اینمی ذکر شده در پشت کارت ضمانت اقدام به نصب دستگاه پکیج نموده ام.


مهر و امضاء نصاب :

کد نصاب :

مشهدهای نصاب

محل نصب

مشهدهای محل نصب

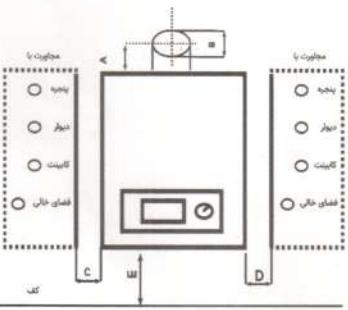

سایر	اداری/تجاری	مسکونی	مورد استفاده
سایر	بالکن	آشپزخانه	محل نصب
کلاهک	تعداد زانو	طول افقی (سانتی متر)	قطعه (سانتی متر)
			مشخصات
			دودکش
			نوع دودکش
		دو جداره	نک جداره
		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E	D	C	B
			A
			فاصله پکیج سانتی متر

کد ملی مشتری :

نام و نام خانوادگی :

تلفن: نشانی مشتری (محل نصب) :

اینجانب با مطالعه و رعایت کامل کلیه مطالب ذکر شده در روی کارت ضمانت و دفترچه راهنمای محصول ، تایید کروکی محل نصب و دودکش مندرج در کارت و همچنین با توجه به راهنمایی های به عمل آمده توسط نماینده مجاز، متعهد می گردم همواره کلیه الزامات و توصیه ها را رعایت کرده و هیچگاه از دستگاه پکیج در شرایط غیر اینمن استفاده ننمایم.

اثر انگشت و امضاء مشتری :

مشهدهای مشتری

مشهدهای

در طی دوره ضمانت هزینه ایاب و ذهب بر عهده مشتری است و هر گونه خدمات که ناشی از اشکال در تولید دستگاه نباشد از جمله رسوب گیری و یا مواردی که به درخواست مشتری انجام می پذیرد بر عهده مشتری است. نصب دستگاه در صورتی کامل است که علاوه بر اتصالات هیدرولیکی و الکتریکی، لوله های ارتباطی دودکش به طور صحیح نصب شده باشد. (تهیه لوله های ارتباطی دودکش و هزینه مربوطه بر عهده مشتری است)



شله خیز آذر

ایران - تبریز

www.sholehkhiz.cominfo@sholehkhiz.com

۰۴۱-۴۲۵۴۴۴۱۵-۱۷



۱۰۰۸۹۶۳

شماره سریال :

نوع دستگاه :

تاریخ نصب (شروع دوره ضمانت) :

محل نصب :

مشهدهای دستگاه

مصرف کننده گرامی :

به منظور اطمینان از اصالت قطعات بدلیل نیاز جهت هر گونه سرویس و عیب یابی فقط و فقط با دفاتر خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید. بدینه است پس از اتمام دوره گارانتی دستگاه، در صورت استفاده از قطعات بدلیل متفرقه مستولیت متوجه این شرکت نمی باشد.

ارائه هر گونه خدمات اعم از نصب، گارانتی و غیره ... فقط توسط سرویسکاران مجاز این شرکت امکان پذیر می باشد.

الزامات ایمنی و شرایط نصب

دستگاه صحیح و سالم تحويل گردد. • دستگاه را برای اصول ایمنی نصب گردد. • استفاده از گاز مایع سبب ابطال گارانتی می گردد. • استفاده از محفظ برق دارای استاندارد الایمنی می باشد. • دستگاه در حمام، یا آتاق خواب نصب نشده و پنجره حمام به محل نصب باز نگردد. • محل نصب دارای تهویه مناسب باشد. • محل نصب دارای دودکش و مکش مناسب باشد. • دودکش به کلاهک اج (H) مجهز گردد. شرایط نصب با الزامات و توصیه های ایمنی مندرج در راهنمای استفاده از دستگاه مطابقت داشته باشد. • دودکش به صورت مستقل نصب شده و با دودکش هیچ وسیله دیگری نظیر هود آشپزخانه و غیره در محل نصب ارتباط نداشته باشد.

• خرابی مبدل دستگاه بدلیل رسوب آب شامل گارانتی نمی باشد.

• روش استفاده و نگهداری از دستگاه و ملاحظات ایمنی توسط نصاب آموزش داده شود.

• شرایط مشخص سختی آب بررسی شده باشد. (در مناطق با سختی آب بالای ppm 250 باید از سختی گیر داری استاندارد ملی استفاده شود)

• از شیلنگ گاز و اتصالات نصب دارای استاندارد ملی با طول و بست مناسب استفاده گردد. • لوله کشی آب و مدار شوفاز دستگاه با شیلنگ، لوله و اتصالات استاندارد و مناسب انجام گردد. • عدم وجود صافی دارای استاندارد ملی در مسیر برگشت شوفاز باعث خارج شدن بمب از گارانتی می شود. • پمپ در مسیرهای پرافت فشار گرمایش که با منحنی مشخصه پمپ مطابقت نداشته باشد شامل گارانتی نمی شود. • هر گونه جایجاوی در محل نصب دستگاه فقط توسط نصاب مجاز و با هزینه مشتری صورت می گیرد، در غیر این صورت دستگاه از ضمانت خارج می شود.

• تمامی ملحقات ذکر شده می باشند دارای تایید استاندارد ملی ایران باشند و کلیه مسئولیت ناشی از نصب آنها متوجه تولید کننده یا وارد کننده آن می باشد و به شرکت شعله خیز آفر مرتبه نمی باشد.

- در صورت نصب دستگاه توسط نصاب مجاز شرکت و رعایت کلیه الزامات ایمنی و شرایط نصب و همچنین استفاده از دستگاه طبق دستورالعمل و راهنمای مربوطه، پکیج های دیواری به مدت بیست و چهار ماه از تاریخ نصب ضمانت می گردد. بدینه است شرکت از ارائه هر گونه سرویس به پکیج هایی که توسط افراد متفرقه نصب یا تعمری شده باشد معدوم است.

- در صورت نصب دستگاه در فضای باز و عدم استفاده از دستگاه و یا عدم سکونت در محل، طبق دستورالعمل دفترچه راهنمای نصب، آب داخل دستگاه را تخلیه نمایند. ضمناً در فصل سرما عالی بندی مناسب کلیه لوله ها و شیلنگ های رابط و اتصالات و تجهیزات خارجی دستگاه از جمله رسوب گیر و غیره توسط معرف کننده الزامی است در غیر این صورت از شرایط ضمانت این شرکت خارج و مسئولیت بروز هر گونه خرابی دستگاه و یا حادثه و خسارت احتمالی منحراً متوجه مصرف کننده می باشد.

- از قرار دادن و یا روشن کردن هر گونه وسایل گرمایشی مانند اجاق گاز و غیره در زیر دستگاه و یا گرفتن انشعاب از گاز ورودی به دستگاه جدا خودداری نمایید. - آسیب بر اثر عواملی از قبیل نوسانات برق، حوادث طبیعی (آتش سوزی، سیل، زلزله) و دیگر اتفاقاتی که مربوط به دستگاه نمی باشد، شامل ضمانت نمی گردد.

- سرویس سالیانه پکیج شوفاز دیواری الزامی می باشد، قبل از شروع فصل سرما از صحت کارکرد مدار شوفاز اطمینان حاصل نمایید.

چک لیست نصب دستگاه پکیج دیواری

■ محل نصب دارای تهییه مناسب بوده و تهییه هوا از طریق دریجه به ابعاد و یا سایر انجام می گیرد.
■ حداکثر فاصله مصرف آبگرم تا دستگاه پکیج متر می باشد.

■ محل نصب دارای دودکش استاندارد مستقل به قطر سانتی متر بوده و مکش آن مناسب می باشد.
■ بست نگهدارنده توسط ۲ عدد رول پلاک و پیچ های مناسب بطور صحیح و محکم صورت گرفته است.

■ بست نگهدارنده بر روی دیواری از جنس: کاشی گچ سایر نصب شده است.
■ دستگاه پکیج بر روی بست نگهدارنده بصورت صحیح قرار گرفته است.

■ دستگاه در حمام، رختکن یا آتاق خواب نصب نشده است و پنجره حمام به محل نصب باز نمی شود.
■ دستگاه محفوظه احتراق باز و دودکش تک جداره مطابق با استانداردها و مقررات جاری کشور نصب گردیده است.

■ دستگاه محفوظه احتراق بسته به حالت دودکش دو جداره، دو لوله ای و یا سایر مطابق با استانداردها و مقررات جاری کشور نصب گردیده است.
■ کلیه اتصالات لوله دودکش و محل اتصال آن به مجرای خروجی روی دیوار به صورت محکم و درزبند انجام گرفته است.

■ دودکش به کلاهک H مجهز می باشد
■ شستشوی مدار گرمایش و تمیزکاری لوله ورودی گاز به دستگاه صورت گرفته است.

■ کلیه شیلنگ ها و اتصالات مورد استفاده از نوع مرغوب و استاندارد و توصیه شده شرکت می باشد و در هنگام نصب، اصول ایمنی و فنی و استاندارد رعایت شده است.

■ اطمینان از اتصال صحیح شیلنگ های مدار شوفاز (رفت و برگشت) و ورودی آب سرد و خروجی آبگرم حاصل شده است.
■ از شیرگاز مستقل (بدون اتصال به سایر وسائل گاز سوز مانند اجاق گاز) و شیلنگ گاز استاندارد با طول سانتی متر و بست مناسب استفاده شده است.

■ دستگاه پکیج بالای اجاق گاز یا واژم گاز سوز دیگر قرار نگرفته و حداقل فاصله افقی ۴۰ سانتی متر رعایت شده است.
■ دستگاه نصب شده مجهز به سختی گیر، صافی برگشت و محافظه برق می باشد.

■ هواگیری مدار شوفاز و اطمینان از عدم نشانی اتصالات رادیاتورها انجام شده است.
■ دستگاه پس از کنترل عدم نشانی آب و گاز و با رعایت کامل اصول ایمنی راه اندازی شده است.

■ تکمیل کارت گارانتی و کروکی محل نصب پکیج انجام شده است.
■ سختی گیر نوع با مارک نصب شده است.

■ در صورت نصب پکیج در بالکن توصیه لازم جهت عایق کاری و آموزش برای جلوگیری از بخ زدگی صورت گرفته است.
* اینجانب تکنسین محاز با کد تمامی موارد فوق را بررسی و کنترل نموده
است و در صورت بروز هر گونه مشکل و خسارتی ناشی از عدم نصب صحیح را عهده دار می باشد.

نام و امضاء تکنسین مجاز

مشتری گرامی لطفاً پس از مطالعه، موارد ذیل را تایید فرمائید.

■ تحويل دستگاه بصورت سالم با عملکرد صحیح انجام شد.

■ آموزش نحوه صحیح روش و خاموش کردن و راه اندازی سیستم مدار شوفاز و آبگرم بهداشتی

■ آموزش صحیح استفاده از شیر پر کن و تامین فشار مورد نیاز دستگاه

■ آموزش نگهداری از دستگاه و موارد ایمنی

■ موارد مندرج را مطالعه نموده و انجام خدمات نصب و راه اندازی و آموزش را تایید می نمایم.

نام و امضاء مشتری
